
# CARTA GANTT · CRM EASY OFFICE

*Planificación macro de 18 semanas · línea base (Plan) y avance real (Real). La ejecución operativa se gestiona con Scrum en GitHub Projects.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Inicio del proyecto (lunes S1)** | 10-08-2026 | **Semana actual** | 9 |
| **Fecha de corte del avance** | 09-10-2026 | **Semana inicio Sprint 1** | 7 |

*Celdas en azul con fondo amarillo = datos a editar · Barra clara = Plan · Barra oscura = Real · Línea roja = semana actual · ◆ = hito*

| N° | Actividad | Responsable | Línea | Inicio | Fin | Estado | Desv. (sem) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Levantamiento y validación de requerimientos** | Fernando / Equipo | Plan | S1 | S3 | Completado | | Especificaciones en S7. Validación con Easy Office el 08-10 (S9, ACTA-002). |
| | | | **Real** | S1 | S9 | | +6 | |
| 2 | **Product Vision, MVP y Product Backlog** | Fernando / Equipo | Plan | S2 | S4 | Completado | | Versión 2.0 tras incorporar las especificaciones formales. |
| | | | **Real** | S2 | S7 | | +3 | |
| 3 | **Mockups y validación de flujos** | Marcos | Plan | S2 | S4 | En curso · validación pendiente | | Prototipo de 8 pantallas listo; falta validarlo con la contraparte. |
| | | | **Real** | S2 | | | +5 | |
| 4 | **Arquitectura y seguridad** | Fernando | Plan | S3 | S5 | Completado (v1.0) | | Dos semanas de atraso: se esperaron las especificaciones formales. |
| | | | **Real** | S3 | S7 | | +2 | |
| 5 | **Modelo de datos y estrategia de migración** | Nicolás | Plan | S3 | S6 | Completado (v1.0) | | Una semana de atraso. Ajustes al recibir la planilla Excel. |
| | | | **Real** | S3 | S7 | | +1 | |
| 6 | **Implementación del núcleo interno** | Equipo | Plan | S5 | S10 | En curso · Sprint 2 | | Inicio real con el Sprint 1 el 22-09. |
| | | | **Real** | S7 | | | +2 | |
| 7 | **Automatización documental** | Fernando / Nicolás | Plan | S8 | S13 | No iniciada | | Depende de las plantillas de Easy Office. |
| | | | **Real** | | | | +1 | |
| 8 | **Integración firma electrónica y pagos** | Fernando / Nicolás | Plan | S10 | S14 | No iniciada | | Depende de credenciales y proveedor de pago. |
| | | | **Real** | | | | | |
| 9 | **Pruebas, correcciones y validación** | Equipo | Plan | S9 | S15 | No iniciada | | Pruebas unitarias dentro de cada sprint desde S7. |
| | | | **Real** | | | | | |
| 10 | **Despliegue y documentación técnica** | Equipo | Plan | S13 | S16 | No iniciada | | Alojamiento pendiente de definir con Easy Office. |
| | | | **Real** | | | | | |
| 11 | **Cierre, entrega y traspaso** | Equipo | Plan | S16 | S18 | No iniciada | | Requiere MVP estable antes de la demostración final. |
| | | | **Real** | | | | | |

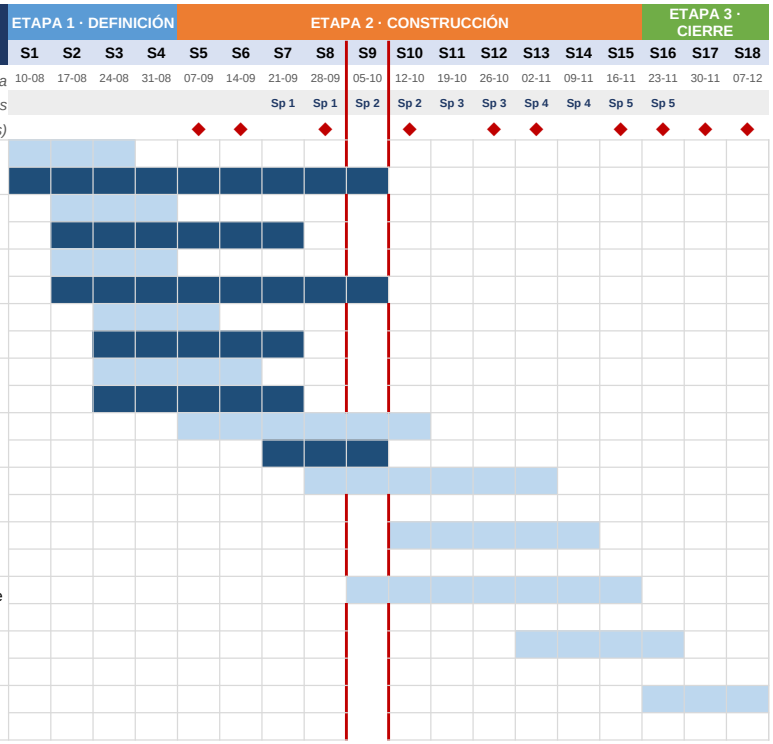


*Desv. (sem): semanas de atraso respecto del plan. En actividades terminadas, fin real contra fin planificado; en curso, el mayor entre el atraso de inicio y la semana actual contra el fin planificado; no iniciadas, semanas transcurridas desde el inicio planificado. Línea base: planificación aprobada en el hito H1.*

## HITOS DE AVANCE

| Hito | Semana | Fecha | Descripción | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| **H1** | S5 | 12-09-2026 | Definición del proyecto aprobada: visión, alcance preliminar y planificación | Cumplido | Presentada el 10-09. |
| **H2** | S6 | 19-09-2026 | Requerimientos y mockups validados con Easy Office | Cumplido | Realizada el 08-10-2026 (S9). Ver ACTA-002. |
| **H3** | S8 | 03-10-2026 | Modelo de datos y arquitectura congelados | En curso | Versiones 1.0 emitidas; se congelan tras la validación. |
| **H4** | S10 | 17-10-2026 | Núcleo interno operativo (revisión de avance con Easy Office) | Pendiente | |
| **H5** | S12 | 31-10-2026 | Migración Excel → PostgreSQL ejecutada | Pendiente | Depende de la entrega de la planilla. |
| **H6** | S13 | 07-11-2026 | Primer trámite completo de extremo a extremo | Pendiente | |
| **H7** | S15 | 21-11-2026 | Integraciones en prueba y batería de pruebas | Pendiente | |
| **H8** | S16 | 28-11-2026 | MVP congelado y documentación técnica entregada | Pendiente | |
| **H9** | S17 | 05-12-2026 | Demostración final del MVP a Easy Office | Pendiente | |
| **H10** | S18 | 12-12-2026 | Cierre del proyecto y traspaso a Easy Office | Pendiente | |

*Fecha = sábado de la semana indicada. Fuente: planificación del proyecto.*

## PLAN DE TRABAJO · 11 ACTIVIDADES

| N° | Actividad | Descripción | Recursos | Semanas | Responsable | Facilitadores | Obstaculizadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Levantamiento y validación de requerimientos** | Analizar entrevistas, requerimiento general, procesos actuales, actores, restricciones y dudas; validar con la contraparte. | Reuniones, transcripciones, herramientas de modelado | S1 – S3 | Fernando / Equipo | Contraparte comprometida y con proceso definido | Disponibilidad de Easy Office y entrega de antecedentes |
| 2 | **Product Vision, MVP y Product Backlog** | Priorizar funcionalidades y separar procesos automáticos, asistidos y fuera de alcance. | Backlog, GitHub Projects, documentación | S2 – S4 | Fernando / Equipo | Especificaciones formales de la contraparte | Validación de alcance con Easy Office |
| 3 | **Mockups y validación de flujos** | Diseñar pantallas y flujos del portal cliente y backoffice; presentarlos a la contraparte. | Herramienta de prototipado | S2 – S4 | Marcos | Experiencia del equipo en UX/UI | Cambios según retroalimentación; agenda de la contraparte |
| 4 | **Arquitectura y seguridad** | Definir componentes, API, autenticación, roles y permisos, auditoría e integraciones. | Diagramas, documentación técnica | S3 – S5 | Fernando | Stack conocido por el equipo | Proveedor de firma y pago puede modificar integraciones |
| 5 | **Modelo de datos y estrategia de migración** | Diseñar el modelo relacional y la estrategia para migrar datos desde Excel. | PostgreSQL, herramienta ER | S3 – S6 | Nicolás | Experiencia del equipo en PostgreSQL | Estructura y calidad de la planilla actual |
| 6 | **Implementación del núcleo interno** | Construir autenticación, usuarios, roles, clientes, servicios, estados y auditoría. | Django, DRF, React, Git, Docker | S5 – S10 | Equipo | Scaffold y entorno contenerizado | Dedicación parcial del equipo |
| 7 | **Automatización documental** | Implementar formularios configurables, plantillas y generación de documentos priorizados. | Motor de plantillas, librerías PDF/DOCX | S8 – S13 | Fernando / Nicolás | Documentos legales ya estandarizados por la contraparte | Entrega y formato de las plantillas |
| 8 | **Integración firma electrónica y pagos** | Integrar los servicios externos o implementar la capa desacoplada en ambiente de prueba. | API del proveedor, sandbox, documentación | S10 – S14 | Fernando / Nicolás | Interfaces desacopladas ya diseñadas | Credenciales, API y decisión del proveedor de pago |
| 9 | **Pruebas, correcciones y validación** | Ejecutar pruebas unitarias, de integración, seguridad, rendimiento y aceptación; corregir hallazgos. | pytest, locust, bandit, checklist | S9 – S15 | Equipo | Pruebas incorporadas a la Definition of Done | Tiempo disponible antes del cierre |
| 10 | **Despliegue y documentación técnica** | Contenerizar, configurar el ambiente, actualizar README y manual técnico. | Docker, GitHub, hosting | S13 – S16 | Equipo | Entorno contenerizado y portable | Alojamiento sin definir |
| 11 | **Cierre, entrega y traspaso** | Preparar la demostración final, entregar el MVP, la documentación y los accesos, y traspasar la operación a Easy Office. | Demo, repositorio, manual técnico, acta de entrega | S16 – S18 | Equipo | Evidencia acumulada por sprint | Requiere MVP estable antes de la demo |

## CALENDARIO DE SPRINTS

| Sprint | Semanas | Inicio | Término |
|---|---|---|---|
| 1 | S7 – S8 | 22-09-2026 | 03-10-2026 |
| 2 | S9 – S10 | 06-10-2026 | 17-10-2026 |
| 3 | S11 – S12 | 20-10-2026 | 31-10-2026 |
| 4 | S13 – S14 | 03-11-2026 | 14-11-2026 |
| 5 | S15 – S16 | 17-11-2026 | 28-11-2026 |

*Sprints de dos semanas, de martes a viernes de la semana s*

| Foco | Estado |
|---|---|
| Entorno, núcleo de datos y accesos | Cerrado |
| Servicios contratados, vigencias y migración | En curso |
| Motor configurable y generación documental | Planificado |
| Portal de contratación e integraciones | Planificado |
| Pruebas, despliegue y estabilización | Planificado |

*iguiente. Detalle en SPR-001.*
